Udbudstidsplan totalrådgivning
Ny Hollænderskolen, Frederiksberg

Udkast 4. januar 2019
Rev. X dd.mm.åååå

Id	Aktivitet	Tid	Startdato	Slutdato
1				
2	**Totalrådgiverudbud UBL**	**101 dage**	**fr 01-03-19**	**on 31-07-19**
3	Bekendtgørelse	1 dag	fr 01-03-19	fr 01-03-19
4	Ansøgningsfrist	30 f.dage	fr 01-03-19	sø 31-03-19
5	Tillæg for frist en søndag	1 dag	ma 01-04-19	ma 01-04-19
6	Evaluering og udvælgelse	10 dage	ti 02-04-19	ma 15-04-19
7	Godkendelse hos ordregiver	5 dage	ti 16-04-19	to 25-04-19
8	Meddelsesbreve	2 dage	fr 26-04-19	ma 29-04-19
9	Tilbudsfrist	25 f.dage	ma 29-04-19	fr 24-05-19
10	Tillæg for frist en søndag	0 dage	fr 24-05-19	fr 24-05-19
11	Evaluering tilbud	10 dage	ma 27-05-19	on 12-06-19
12	Udarbejde indstilling	5 dage	to 13-06-19	on 19-06-19
13	Godkendelse hos ordregiver	5 dage	to 20-06-19	on 26-06-19
14	Elektronisk underretning	3 dage	to 27-06-19	ma 01-07-19
15	Standstill	10 f.dage	ti 02-07-19	fr 12-07-19
16	Tillæg for frist en søndag	0 dage	fr 12-07-19	fr 12-07-19
17	Kontrahering	1 dag	ma 15-07-19	ma 15-07-19
18	Mobilisering	12 dage	ti 16-07-19	on 31-07-19
19	**Projektering**	**135 dage**	**to 01-08-19**	**on 12-02-20**
20	Dispositions- og projektforslag	45 dage	to 01-08-19	on 02-10-19
21	Bygherregodkendelse	10 dage	to 03-10-19	on 16-10-19
22	Myndighedsprojekt	10 dage	to 17-10-19	on 30-10-19
23	Bygherregodkendelse	10 dage	to 31-10-19	on 13-11-19
24	Myndighedsbehandling	60 dage	to 14-11-19	on 12-02-20
25	Hoved- og udbudsprojekt	40 dage	to 14-11-19	on 15-01-20
26	Bygherregodkendelse	10 dage	to 16-01-20	on 29-01-20
27	**Begrænset udbud hovedentreprise TB**	**77 dage**	**to 30-01-20**	**ma 25-05-20**
28	Tilbudsfase	30 dage	to 30-01-20	on 11-03-20
29	Licitation	1 dag	to 12-03-20	to 12-03-20
30	Evaluering	15 dage	fr 13-03-20	to 02-04-20
31	Bygherregodkendelse	25 dage	fr 03-04-20	to 14-05-20
32	Underretning	1 dag	fr 15-05-20	fr 15-05-20
33	Kontrahering	5 dage	ma 18-05-20	ma 25-05-20
34	**Udførelse**	**324 dage**	**ti 26-05-20**	**ma 30-08-21**
35	Mobilisering	20 dage	ti 26-05-20	on 24-06-20
36	Udførelse Gule fløj	180 dage	to 25-06-20	ti 09-03-21
37	Aflevering Gule fløj	1 dag	on 10-03-21	on 10-03-21
38	Mangelafhjælpning Gule fløj	20 dage	to 11-03-21	on 07-04-21
39	Indflytning Gule fløj	1 dag	to 08-04-21	to 08-04-21
40	Udførelse øvrige arbejder	80 dage	fr 09-04-21	to 29-07-21
41	Aflevering øvrige arbejder	1 dag	fr 30-07-21	fr 30-07-21
42	Mangelafhjælpning øvrige arbejder	20 dage	ma 02-08-21	fr 27-08-21
43	Indflytning øvrige arbejder	1 dag	ma 30-08-21	ma 30-08-21
44				
45	***Eksamensperioder***	***1 dag?***	***fr 18-01-19***	***fr 18-01-19***
46	***Andre støjfri perioder?***	***1 dag?***	***fr 18-01-19***	***fr 18-01-19***

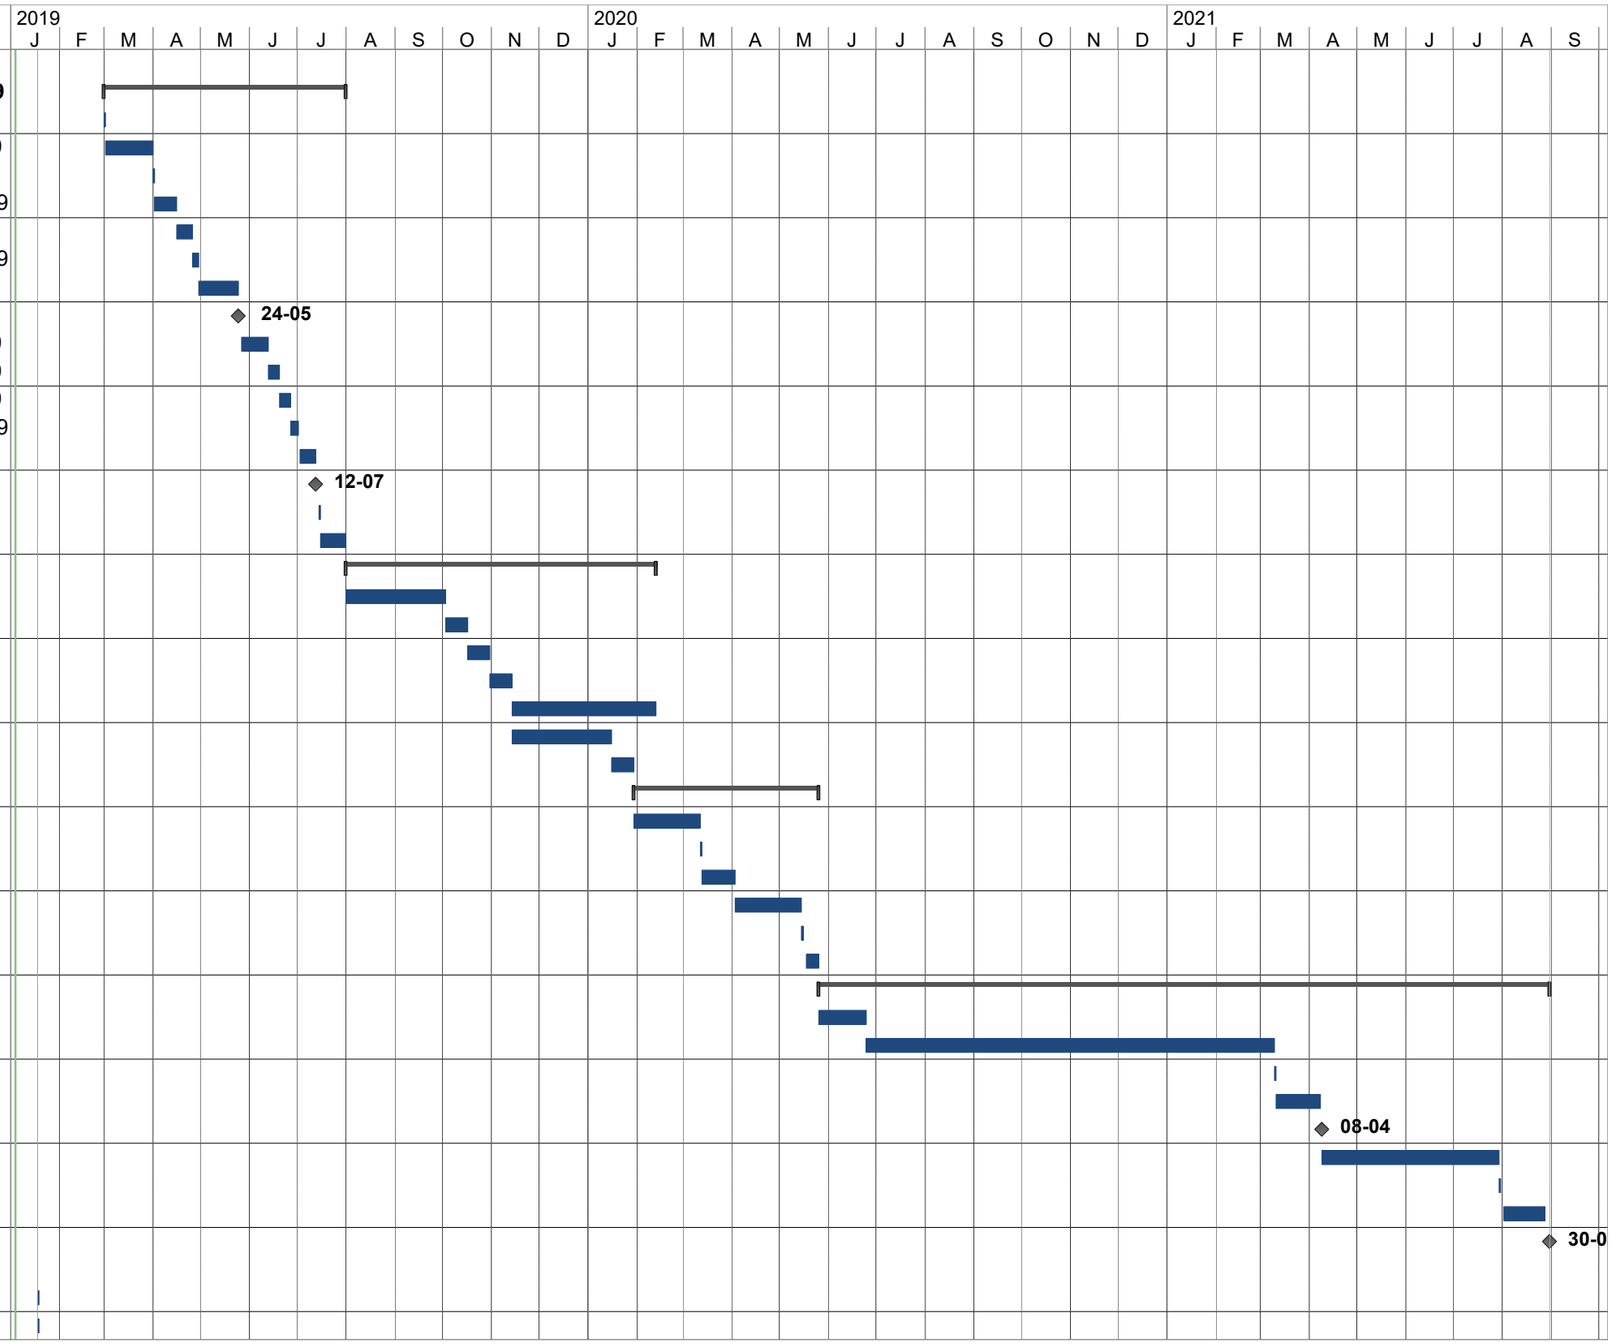

SWECO
